

2026년 ICT기반 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업

중간보고

카자흐스탄 암환자 대상 ICT 기반 사전상담·사후관리 통합 의료연계 서비스 구축 (HEALO 플랫폼)

주관 본로이 · 참여 면력한방병원 · 신촌면력한방병원 · 사업기간 2026.04 ~ 11 · 발표 2026.08.27

1. 사업 총괄 요약

1부

사업 개요

2026-05-14 수행계획서 확정본 기준

구분	내용
사업명	카자흐스탄 암환자 대상 ICT 기반 사전상담 및 사후관리 통합 의료연계 서비스 구축
사업기간	2026. 04. ~ 2026. 11. (8개월)
대상국가 · 고객	카자흐스탄 (러시아·키르기스스탄·CIS 확장) / 암환자 및 보호자
사업비(계획액)	총 87,500천원 · 보조금 70,000천원(80%) · 자부담 17,500천원(20%)
주관기관 / 책임자	본로이 / 강주영 대표
참여기관	면력한방병원 · 신촌면력한방병원

▶ 유치업 등록 A-2026-01-02-06761 · SGI 서울보증 배상책임보험 1억 · 보유특허 2건

1부

총괄 요약

15 회

해외 파트너 미팅

카자흐 9 · 러시아 3 · 기타 3

4 건

계약 · 협약 체결

에이전시 1 · MOU 3

9 건

실환자 문의 접수

5월 1 · 6월 1 · 7월 4 · 8월 3

15 건

사전상담·사후관리

목표 120건 대비 12.5%

사업목적

CIS 암환자가 브로커에 의존하지 않고 한국 양·한방 협진에 접근하도록 ICT 사전상담·사후관리 체계를 구축

추진실적

플랫폼 구축 완료(6개 언어·원격협진·AI 상담·성과 대시보드) / 해외 파트너 15곳 접촉 · 4건 체결 / 사전상담 누적 15건

성과 활용계획

구축 플랫폼을 2027년 이후 자체 유치사업 및 참여병원 대상 이용료 모델로 전환

문제점 및 건의

유치 확정·만족도는 아직 0 — 사전상담은 누적 15건(12.5%)으로 증가 중. 유치 전환을 8월 광고·파트너 실사로 밀어붙이는 중

▶ 연결망을 만들었고, 사전상담 15건이 그 통로가 실제로 작동함을 보여줍니다.

1부

계획 대비 추진실적

수행계획서 월별 마일스톤 대비

월	추진계획 (당초)	추진실적	비고
4월	플랫폼 설계	설계 완료 · 개발 착수	정상
5월	설계 완료 + 환자 유치 개시	플랫폼 배포 · MOU 2건 체결	정상
6월	플랫폼 개발 (현지어 UI·원격상담)	6개 언어 UI·원격협진·AI 상담·성과 대시보드 구축 / 해외 미팅 4회	정상
7월	개발 완료 + 원격협진·사후관리 본격화	개발 완료 / 해외 미팅 11회 · 계약 2건 체결 / 홍보비 집행 개시	실환자 송출 지연
8월	원격협진·치료·사후관리 운영	영상 사전상담(08.03)·소견서 발급(08.04) / 대학병원 의뢰 2곳 발송(08.10) → 이 대서울 회신 소견 수령(08.14) / 사업계획 변경 승인요청 제출(08.13) / 모바일 앱 정 식 출시(08.13)	일부 달성

▶ 개발 일정은 계획대로 완료. 지연은 「실환자 송출」 한 가지이며 사유·대책은 자체 중간평가에서 보고합니다.

2. 원격진료 부문

왜 카자흐스탄인가

우리 주장이 아니라 정부 기관의 분류입니다

진흥원 분류 (2025.12 발간)	해당 국가	특징
미용 · 시술 중심 국가	일본 · 대만 · 중국 · 태국	의료 소비의 75% 이상이 피부 · 성형
치료형 고액 소비 국가	카자흐스탄 · 몽골	종합병원 · 내과 중심 — 무겁고 비싼 치료
복합형 소비 국가	미국	의료와 관광을 병행

우리 타깃은 「미용 대세」의 예외 구역 — **진흥원이 자기 분류로 적어놨습니다**


정직하게 같이 말할 불리한 사실

- 카자흐스탄 2025년 1.5만 명 — 순위 11위→13위 하락, 증가율 +4.9%로 상위 15개국 중 최저
- 러시아 2만 명 — 9위→11위 하락 (인원 +21.9%이나 피부과로 이동)
- 즉 「시장이 커져서 들어갔다」가 아니라 「성격이 우리와 맞아서 들어갔다」입니다

출처: KHIDI 「2024 신용카드 데이터로 본 외국인환자 소비패턴 분석 보고서」(2025-12-16) · 보건복지부 「2025년 외국인 환자 유치 200만 돌파」 보도자료 (2026-08-11 원문 확인)

사업 수행 체계

환자 한 명이 지나가는 경로



전 구간을 HEALO 플랫폼 한 곳에서 기록·추적 — 사전상담부터 사후관리까지 끊기지 않음


주관기관	본로이	플랫폼 개발·운영, 유치 총괄, 사전상담·사후관리 체계 운영
참여기관	면력한방병원	암 재활·면역 치료, 세컨드 오피니언 작성, 협진 연계
참여기관	신촌면력한방병원	암 재활·사후관리 프로그램 운영, 만족도 조사

※ 협진 상급종합병원(이대서울·이대목동·고려대구로·신촌세브란스)과 해외 파트너는 협력 네트워크이며 사업 참여기관은 아님.


2부 · 2. 추진성과 ①

환자가 실제로 보는 화면


6개 언어 중 러시아어 화면 — healwith.co.kr/ru

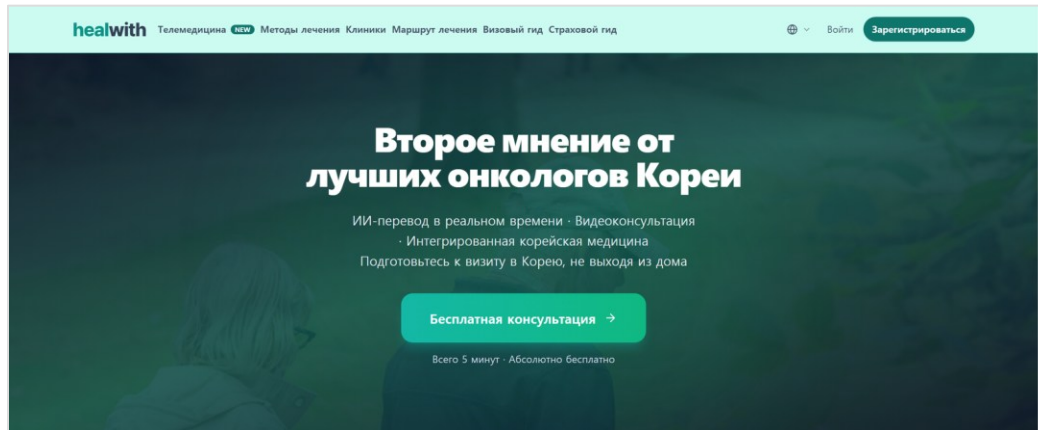

첫 화면 — 「한국 최고 종양 전문의의 세컨드 오피니언」



문의 접수 — AI 상담 / 상담원 연결 / 접수 폼 3가지 경로

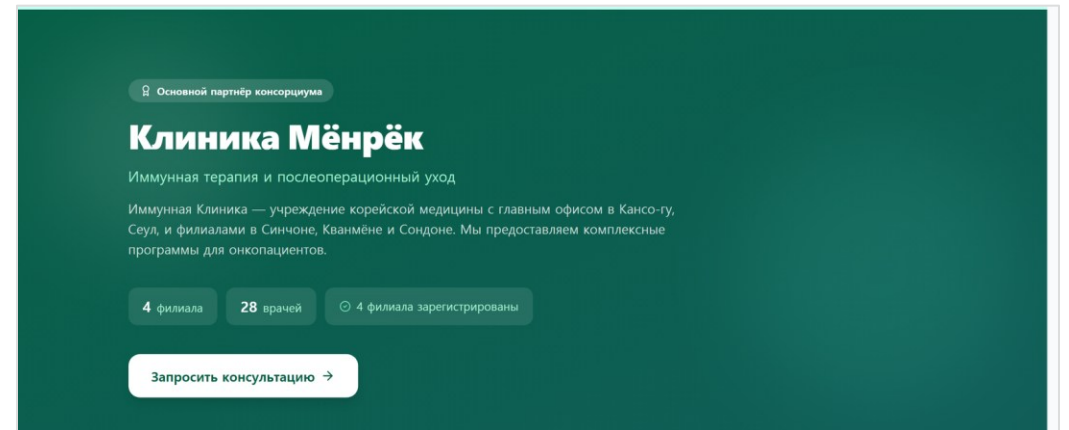

협진 병원 안내 — 러시아어 병원 정보·위치

구축 규모


- 화면 137개 × 6개 언어 (한·영·러·카자흐·중·일)
- 서버 기능 215개 · 사용자 권한 5종
- 환자 개인정보 암호화(AES-256) 저장
- 모바일 앱(iOS·Android) 빌드 완료

▶ 러시아어·카자흐어를 「번역해 붙인 것」이 아니라 처음부터 6개 언어로 설계했습니다.

2부 · 2. 추진성과 ②

원격협진 — 실시간 통역

환자는 현지에서, 의료진은 한국에서

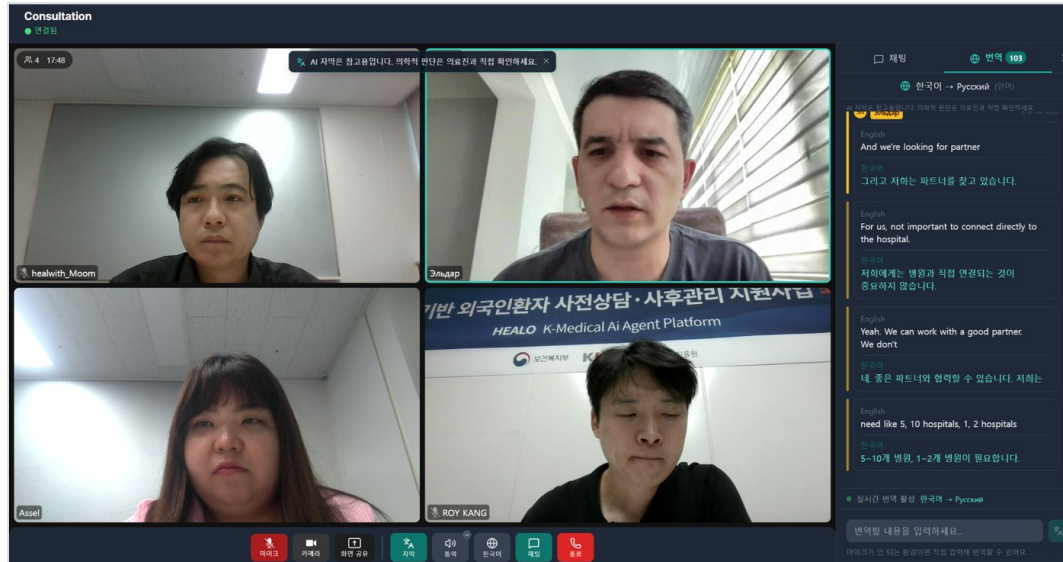

2026.07.29 튀르키예 Sayluk 협의 — 우리 플랫폼 상담방, 오른쪽이 한국어→러시아어 실시간 자막 번역 패널



2026.07.20 카자흐 Clinic Navigator 협의 — 화면 하단에 러시아어 실시간 자막

3,481 건

실시간 통역 자막 누적
플랫폼이 실제로 생성한 기록

284 건

화상방 입장 기록
협진·상담방 실사용

112 건

한 회의에서만
2026.07.14 카자흐 파트너 회의


▶ 비대면 협진은 2027년 5월 시행 의료해외진출법 개정으로 제도화됩니다 — 우리는 앞서 구축해 파트너 협의에 이미 쓰고 있습니다.

성과를 스스로 세는 화면

ICT 사업이 자체 ICT로 성과를 계량합니다



관리자 화면 — 공식 정량지표 3개의 목표 대비 달성률이 매일 자동 갱신



유치 갈때기 — 접수된 문의가 어느 단계에서 멈춰 있는지 그대로 표시

자동으로 도는 안전장치

- 집계 오류가 나면 운영자에게 즉시 알림
- 상담 완료 시 만족도 설문 자동 발송·소급 보정
- 종료 처리 안 된 상담이 쌓이면 자동 경보
- 사무실 IP·테스트 계정 문의는 실적에서 자동 제외

▶ 화면의 「0」은 숨긴 값이 아니라 시스템이 매일 계산해 그대로 내보이는 값입니다.

성과지표 달성 현황

테스트·데모 데이터 전부 제외 — 2026-08-18 기준

구분	성과지표	목표(A)	달성(B)	달성률(B/A)	집계 출처
정량·필수	외국인환자 유치	12 건	0 건	0%	유치 전환 대시보드 (자동)
정량·부가	사전상담 · 사후관리	120 건	15 건	12.5%	월간 업무보고 4~7월 누적
정량·부가	환자 만족도	90 점	미측정	—	만족도 설문 (자동)
정성	ICT 사전상담·사후관리 체계	플랫폼 구축	구축 완료	달성	플랫폼 시연·산출물
정성	양·한방 협진 연계 치료모델	협진체계 수립	수립·운영 중	달성	원격협진·참여병원·UMIT MOU

▶ 사전상담은 5월 1 → 6월 4 → 7월 10건으로 늘어 누적 15건(12.5%)입니다. 유치 확정·만족도가 남았습니다.


※ 6건 구성 — 영상 사전상담 1건(카자흐, 08.03) · 서면 소견 전달 5건(키르기스 2 · 카자흐 1 · 플랫폼 도입 이전 상담 소급 등록 2) · 사후관리 0건. 소급 등록분은 화면에 「소급」으로 표기돼 있습니다.

해외 파트너 네트워크


회의록 기준 실제 진행 미팅 15회 (2026.06 ~ 07)



06.17 UMIT 국제암센터(카자흐)

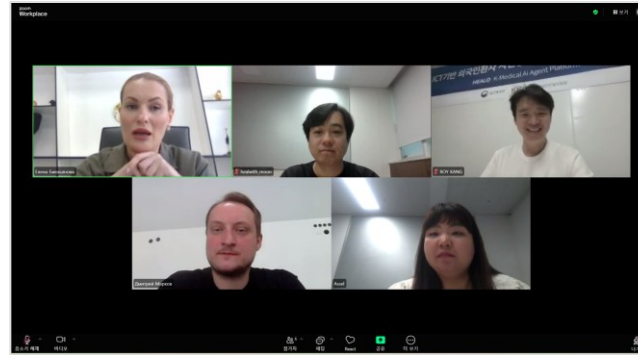

07.06 Madanes 보험사(러시아)

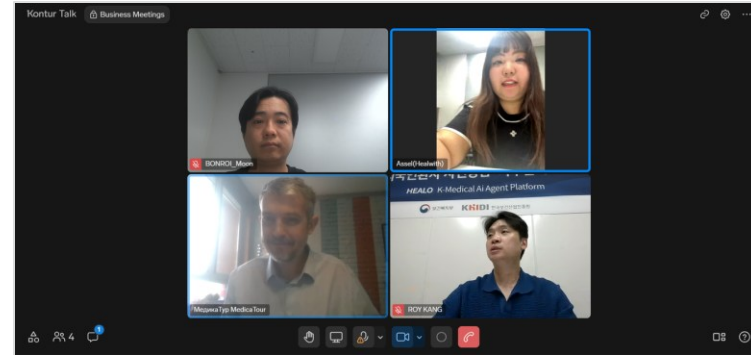

06.19 MedicaTour(러시아)

일자	상대 기관	성격	협약 결과
06.17	UMIT 국제암센터 (카자흐)	의료기관	세컨드 오피니언 협력 → 3자 MOU 체결
06.19	MedicaTour (러시아)	에이전시	계약 체결 합의 → 정식 계약 체결
07.06	Madanes (러시아)	보험회사	보험 가입자 연계 · 전용 계정·보험 페이지 신설
07.15	이화여자대학교 의료원	대학병원	수술 연계 + 본로이 재활케어 공식 협력
07.24	Medtour (카자흐)	에이전시	수수료 10% · 방한 병원 실사 후 송출 개시

▶ 국가별 카자흐 9 · 러시아 3 · 키르기스 1 · 튀르키예 1 · 국내 1 — 합의 수수료 10%는 법정 상한(15%) 이내이며 현지 관행(20~30%)보다 낮습니다.

계약 · 협약 체결 현황

서명·직인 완료본 기준

상대 기관	국가	형태	체결일	핵심 내용
MedicaTour	러시아	에이전시 계약	2026.07.14	환자 의뢰·수수료·분쟁해결(대한상사중재원) 명문화
UMIT 국제암센터	카자흐스탄	3자 MOU	2026.07.20	세컨드 오피니언 3~5명업일 무상 · 귀국 후 현지 경과관찰
Global Healthcare Opulence	인도	MOU	2026.05.15	암환자 의뢰 4개 협력 프로그램
MedVoyage Global	국제 플랫폼	MOU	2026.05.15	국제 환자 의뢰·케이스 관리·회복 프로그램 연계
이화여자대학교 의료원	국내	의료서비스 협약서	2026.07.16	유치환자 수술 시행 + 본로이 재활케어 연계

▶ 이 밖에 Medex Travel · Big Tourism · Sayluk · medguide.kz 등 4곳에 계약·MOU 초안을 송부하고 검토 중입니다.

※ 이화여자대학교 의료원 협약서는 체결일자 기재본 기준이며 서명 원본 보관 상태는 별도 확인 대상입니다.

2부 · 2. 기타성과

홍보실적 및 파급효과


2026.07 제작 완료 — 러시아어 · 카자흐어




홍보영상 · 러시아어



홍보영상 · 카자흐어

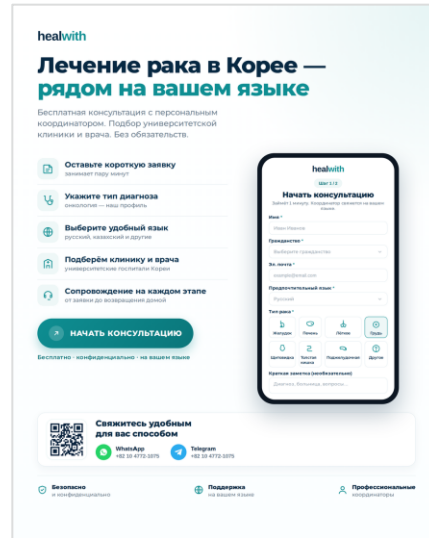

SNS 게시 소개



안내 포스터

사회적 파급효과

- 현지 브로커 관행(수수료 20~30%)을 법정 상한 내 10%로 투명화
- 귀국 후 현지 경과관찰 경로 확보 (UMIT MOU) — 유치 후 방치 해소
- 2027.05 의료해외진출법 개정 (비대면 협진 허용)에 앞선 구축

온라인 마케팅 위탁계약 2026.07.16 체결 · 개발은 자체 수행해 외주 개발비 0원

▶ 사업비는 개발 용역이 아니라 홍보·인프라·현지 확장에 쓰였고, 플랫폼은 사업 종료 후에도 회사에 남습니다.

잘된 점 · 부진한 점 · 대책

잘된 점

- 플랫폼 개발이 계획 일정대로 완료
- 해외 파트너 15곳 접촉 → 4건 체결

부진한 점

- 정량지표 3개 모두 0
- 실환자 송출이 아직 발생하지 않음

문제점 · 애로사항

- 파트너가 방한 병원 실사 후 송출을 요구
- 현지 수요가 튀르키예·중국에 선점됨

자체 발전방안

- 8월 현지 검색광고로 직접 유입 병행
- 파트너 방한 병원 투어 8월 중 실시

▶ 부진 원인은 기능 미비가 아니라 현지 신뢰 확보에 걸리는 시간이며, 대책은 광고와 실사 투어입니다.

수익모델 및 매출계획

현장 협의로 확정된 수수료 조건 반영

수익 모델

- ① 유치 수수료 치료비의 15~30% (법정 상한 내)
- ② 플랫폼 이용료 월 50~100만원 / 기관
- ③ 의료관광 패키지 건당 100~200만원

현장 협의로 확정된 조건

- 에이전트 지급 수수료 10% (다수 파트너 합의)
- 암 8% / 피부·미용 10% 차등 제안
- 환자는 병원에 직접 결제 — 본로이 마진 없음

연도	2026	2027	2028	2029	2030
유치 목표(건)	12	30	60	100	150
매출 계획	—	1.8억	3.5억	6억	10억

2027년 손익분기점 도달 전제

▶ 당초 계획 대비 변경 없음. 보험사 채널(러시아 Madanes)이 신규 유입 경로로 추가됐습니다.

3. 사업비 집행 중간정산

비목별 집행 내역

증빙 원본 보유 — 세금계산서·영수증·계약서 · 2026-08-18 기준

비목	일자	집행 내역	집행액	증빙
일반수용비 (홍보비)	07.16	온라인 마케팅 위탁 — 홍보영상 2편·SNS 소재 제작	7,700,000 원	위탁계약서 · 세금계산서 · 비교견적 · 계좌 이체 승인공문
운영비 (앱 배포)	07.24	Apple 개발자 프로그램 1년	117,273 원	온라인 매출전표
운영비 (서버·DB)	07.23	Vercel Pro (호스팅) 1개월	\$22.00	인보이스 · 영수증
운영비 (서버·DB)	07.24	Supabase Pro (데이터베이스) 1개월	\$27.50	인보이스 · 영수증
운영비 (영상)	07.28	LiveKit (원격협진 영상)	\$6.36	청구서 · 영수증
소모품비	07.30	참여병원 2곳 프린터 토너 (면력한방·신촌면력한방)	확정 대기	거래명세서
합계		보조금 예산 70,000천원 대비 집행률 약 11.2%	7,829,000 원 + US\$55.86	잔액 약 62,171천원

※ 과세사업자는 부가가치세를 뺀 공급가액만 집행액으로 잡습니다(집행지침). 해외 결제분(US\$55.86)은 카드 청구 원화 확정 후 합산하며, 소모품비 확정액·자부담 현물은 정산 시 조정됩니다.

▶ 개발을 자체 수행해 외주비가 없었고, 집행은 홍보·인프라·소모품에 집중되어 있습니다.

4. 원격협진 솔루션 개발 · 고도화

항목별 추진현황

SW 개발 생명주기 단계별 — 계획일정 대비


단계	업무내용	계획일정	추진일정	지연
분석	현황분석 · GAP분석 · 요구사항 도출	4월	4월 완료	없음
설계	인터페이스 · 데이터 · 프로그램 · 시험 설계	4~5월	5월 완료	없음
개발	개발 및 구축 (6개 언어·원격협진·AI 상담·백오피스)	6~7월	7월 완료	없음
시험	통합·시스템 시험 (자동검사 상시 가동)	7월	7월 완료 · 상시 운영	없음
운영	운영환경 준비 · 설치 및 인도 · 운영 및 통제	7~11월	7월 개시 · 운영 중	없음

▶ 개발 단계는 전 항목 계획대로 완료. 현재는 「운영 및 통제」 단계입니다.

※ 미진사유 발생 항목 없음. 참여인력·투입 MD 내역은 보고서 본문에 별도 첨부.

법과 정책이 우리 쪽으로 오고 있습니다

지금 만든 것이 2027년에 법이 정한 형태가 됩니다



이 일정이 우리에게 뜻하는 것

- 우리가 이미 운영 중인 흐름(원격협진방 + 사전상담 → 사후관리)이 2027년 5월부터 법에 적힌 진료 형태가 됩니다 — 법이 안 따라온 실험이 아니라 시행에 맞춰 미리 깔아둔 인프라입니다
- 진흥원이 2026-07-30 발주한 표준 운영체계의 이름이 「사전·사후관리」 — 우리 성과지표와 같은 영역입니다. 국가 표준이 만들어지는 자리에 이미 같은 구조로 서 있습니다
- 절차·방법 위반 시 유치기관 등록취소 조항이 달려 옵니다 → 「누가·언제·어떤 방식으로 상담했는지」가 기록으로 남는 우리 구조가 그대로 준비 상태입니다

▶ 다만 시행 전이므로 현재 우리 원격협진은 「진료」가 아니라 「상담·정보제공」 범위로 운영하고 있습니다.

개선 및 향후 추진계획

중간보고 이후 사업종료(11월)까지

시기	핵심 과제	목표 / 산출
8월	현지 검색광고 개시(카자흐·러시아어) + 파트너 방한 병원 실사 투어	첫 유치 확정 발생 · 사전상담 실건수 축적
9월	사전상담 → 유치 → 수술(협진 대학병원) → 한방 재활 연계 본격 가동	유치 건수 누적 · 상담 완료 처리 정착
10월	사후관리 케이던스 실환자 적용 + 만족도 설문 수집 / UMIT 현지 경과관찰 개시	사후관리 건수 · 만족도 점수 측정 개시
11월	성과평가 · 최종보고 · 2027년 확장 계획 확정	최종 성과지표 확정 · 차년도 사업화

▶ 잔여 보조금(약 6,288만원)은 현지 광고·파트너 실사 초청·인건비·국외여비에 집중 투입합니다.

질의응답 대비

예상 질문과 답변

미리 준비한 답만 적었습니다

예상 질문	답변
카자흐스탄 증가율이 상위 15개국 중 꼴찌인데, 왜 그 시장에 들어갔습니까?	맞습니다. 1.5만 명·순위 13위·증가율 +4.9%로 최저입니다. 다만 같은 통계가 카자흐를 「내과·검진 중심」이라 적었고, 진흥원은 「치료형 고액 소비 국가」로 분류했습니다. 즉 중증(암)은 아직 연결 통로가 없어서 안 오는 것일 수 있습니다. 저희는 건수가 아니라 성격으로 승부하는 시장으로 보고 그 통로를 만드는 중입니다. ※ 다만 「수요 자체가 작다」는 반대 해석도 가능하며, 어느 쪽인지는 저희 상담 데이터로만 가려집니다.
유치 실적이 0인데 사업이 되고 있는 겁니까?	사전상담·사후관리가 15건(목표 120건 대비 12.5%)이고 유치 확정·만족도는 0입니다. 숨기지 않겠습니다. 다만 집계 인프라는 완성돼 매일 자동으로 돌고 있고, 해외 파트너 15곳과 접촉해 4건을 체결했습니다. 남은 것은 실환자 송출이며 8월 광고와 파트너 방한 실사로 밀어붙이고 있습니다.
ICT라는데 다른 유치업체와 뭐가 다른니까?	성과를 저희가 세지 않고 시스템이 셉니다. 오늘 화면의 「0」도 저희가 쓴 숫자가 아니라 매일 자동 집계된 값입니다. 실시간 통역 자막 3,481건·화상방 입장 284건이 그 기록이며, 테스트 데이터는 자동 제외됩니다.

▶ 불리한 통계는 먼저 꺼내고, 그다음 우리 판을 설명합니다.

정리하면

플랫폼과 파트너 계약은 완성됐고, 남은 것은 실환자 송출입니다.

개발은 계획대로 끝났고 해외 파트너 15곳과 접촉해 4건을 체결했습니다.
사전상담이 누적 15건(12.5%)으로 늘고 있고,
8월 광고 집행과 파트너 방한 실사로 유치 전환까지 밀어붙입니다.

구축 단계 종료 · 송출 개시 단계 진입
